Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1	**Projectsubsidie**	**75 dagen**	**maa 27/10/25**	**vri 6/02/26**		
2	Indienen project	15 dagen	maa 27/10/25	vri 14/11/25		Stad Antwerpen
3	Gunning	0 dagen	vri 6/02/26	vri 6/02/26	2BE+60 dagen	VLAIO
4	**Project Digitale Nuts**	**695 dagen**	**vri 6/02/26**	**vri 6/10/28**		
5	**LAAG 1 – Kernontwikkeling (MVP)**	**280 dagen**	**vri 6/02/26**	**vri 5/03/27**	**3**	
6	*STUURGROEP START*	*0 dagen*	*vri 6/02/26*	*vri 6/02/26*	*3*	*Stuurgroep*
7	**ANALYSEFASE LAAG 1**	**240 dagen**	**maa 9/02/26**	**vri 8/01/27**		
8	aanstelling externe projectleiding	30 dagen	maa 9/02/26	vri 20/03/26	3	Stad Antwerpen
9	Analyse en functioneel ontwerp	4 mndn	maa 23/03/26	vri 10/07/26	8	Digipolis;Stad Antwerpen;Boards
10	feedback uit bestaande toezichtsmethode	2 wkn	maa 4/05/26	vri 15/05/26	8BE+30 dagen	Toezichtteams
11	OSLO-profiel en API-mapping	9 mndn	maa 4/05/26	vri 8/01/27	8BE+30 dagen	Digitaal Vlaanderen;Athumi;Boards
12	GIPOD-koppeling & pilotdata	4 mndn	maa 4/05/26	vri 21/08/26	8BE+30 dagen	Athumi;Digipolis
13	*STUURGROEP*	*0 dagen*	*vri 21/08/26*	*vri 21/08/26*	*12*	*Stuurgroep*
14	**ONTWIKKELFASE MVP app + portaal**	**130 dagen**	**maa 13/07/26**	**vri 8/01/27**		
15	aanstellen ontwikkelaar	30 dagen	maa 13/07/26	vri 21/08/26	9	Digipolis
16	ontwikkeling mobiele app	5 mndn	maa 24/08/26	vri 8/01/27	15	externe ontwikkelaar;Boards
17	KPI-definitie & calculatiemodule	2 mndn	maa 24/08/26	vri 16/10/26	15	Boards;externe ontwikkelaar
18	feedback toezichtsmethode	2 wkn	maa 19/10/26	vri 30/10/26	17	Toezichtteams
19	Backoffice portaal	1,5 mndn	maa 19/10/26	vri 27/11/26	17	externe ontwikkelaar, AThumi
20	Governance Laag 1 handleiding	2 mndn	maa 11/01/27	vri 5/03/27	16	Boards;Projectleiding
21	MVP-pilot op terrein (4 steden)	2 wkn	maa 11/01/27	vri 22/01/27	16	Toezichtteams
22	*STUURGROEP*	*0 dagen*	*vri 5/03/27*	*vri 5/03/27*	*20*	*Stuurgroep*
23	**LAAG 2 – Functionele uitbreiding**	**210 dagen**	**vri 12/03/27**	**vri 31/12/27**		
24	*BOARD Startvergadering*	*0 dagen*	*vri 12/03/27*	*vri 12/03/27*	*22BE+5 dagen*	*Boards;Projectleiding*
25	**ANALYSE LAAG 2**	**40 dagen**	**maa 15/03/27**	**vri 7/05/27**		
26	Analyse en functioneel ontwerp	2 mndn	maa 15/03/27	vri 7/05/27	24	Digipolis;Stad Antwerpen;Boards
27	**ONTWIKKELING LAAG 2**	**130 dagen**	**maa 10/05/27**	**vri 5/11/27**		
28	Integratie vergunning + koppelingen A-Sign, WIS, KLM)	3 mndn	maa 10/05/27	vri 30/07/27	26	Athumi;externe ontwikkelaar;gipod
29	BI-dashboard & rapportering	2 mndn	maa 10/05/27	vri 2/07/27	26	Digipolis;Boards;externe ontwikkelaar
30	AI-pilot herstelcontrole (HITL)	4 mndn	maa 10/05/27	vri 27/08/27	26	Digipolis;externe ontwikkelaar;Boards
31	Communicatiemodule bewoners	3 mndn	maa 10/05/27	vri 30/07/27	26	VVSG, Boards externe ontwikkelaar
32	Consolidatie & nulmeting KPI's	2 mndn	maa 13/09/27	vri 5/11/27	33	Stad Antwerpen + Partners + volgers + experten
33	feedback MVP2 Pilot op terrein (4 steden)	2 wkn	maa 30/08/27	vri 10/09/27	31;30;29;28	Toezichtteams
34	Governance Laag 2	2 mndn	maa 8/11/27	vri 31/12/27	32	Stuurgroep + Boards + VVSG
35	*STUURGROEP*	*0 dagen*	*vri 31/12/27*	*vri 31/12/27*	*34*	*Stuurgroep*
36	**LAAG 3 – Geavanceerde functies & opschaling**	**200 dagen**	**vri 31/12/27**	**vri 6/10/28**		**VVSG + VRN + Digipolis**
37	*BOARD Startvergadering*	*0 dagen*	*vri 31/12/27*	*vri 31/12/27*	*34*	*Stad Antwerpen + Partners + volgers + experten*
38	**ANALYSEFASE LAAG 3**	**40 dagen**	**maa 3/01/28**	**vri 25/02/28**		
39	Analyse en functioneel ontwerp	2 mndn	maa 3/01/28	vri 25/02/28	37	Digipolis;Stad Antwerpen;Boards
40	**ONTWIKKELFASE LAAG 3**	**60 dagen**	**maa 28/02/28**	**vri 19/05/28**		
41	Predictieve planning POC → productie	3 mndn	maa 28/02/28	vri 19/05/28	24;39	externe ontwikkelaar;Digipolis
42	Automatische retributieberekening	3 mndn	maa 28/02/28	vri 19/05/28	24;39	externe ontwikkelaar;VRN;Boards
43	MVP2 Pilot op terrein (4 steden)	2 wkn	maa 22/05/28	vri 2/06/28	42	Toezichtteams
44	**GOVERNANCE & DISSEMINATIE**	**200 dagen**	**maa 3/01/28**	**vri 6/10/28**		
45	Vlaamse data-uitwisseling (OSLO publicatie)	3 mndn	maa 3/01/28	vri 24/03/28	37	Athumi;Digitaal Vlaanderen
46	Opschalingspakket (modelbestek, raamcontract, onboarding, TCO)	6 mndn	maa 3/01/28	vri 16/06/28	37	Boards
47	Governance Laag 3 handleiding en training	2 mndn	maa 14/08/28	vri 6/10/28	50	Boards
48	*STUURGROEP*	*0 dagen*	*vri 16/06/28*	*vri 16/06/28*	*46*	*Stuurgroep*
49	**EINDRAPPORTERING**	**40 dagen**	**maa 19/06/28**	**vri 11/08/28**		
50	Slotrapport & einddemo Vlaamse uitrol	2 mndn	maa 19/06/28	vri 11/08/28	46	Projectleiding + VVSG
51	**OVERLEGSTRUCTUUR**	**706 dagen?**	**maa 27/10/25**	**maa 10/07/28**		
52	**STUURGROEP (2x/jaar)**	**615 dagen**	**vri 6/02/26**	**vri 16/06/28**		**Stuurgroep**
53	ST1	0 dagen	vri 6/02/26	vri 6/02/26	3	Stuurgroep
54	ST2	0 dagen	vri 21/08/26	vri 21/08/26	13	Stuurgroep
55	ST3	0 dagen	vri 5/03/27	vri 5/03/27	20	Stuurgroep
56	ST4	0 dagen	vri 31/12/27	vri 31/12/27	35	Stuurgroep
57	ST5	0 dagen	vri 16/06/28	vri 16/06/28	48	Stuurgroep
58						
59	KLANKBORDGROEP(2x/Jaar)	706 dagen?	maa 27/10/25	maa 10/07/28		
60	KB1	1 dag?	maa 2/03/26	maa 2/03/26	53BE+15 dagen	klankbordgroep
61	KB2	1 dag?	maa 14/09/26	maa 14/09/26	54BE+15 dagen	klankbordgroep
62	KB3	1 dag?	maa 29/03/27	maa 29/03/27	55BE+15 dagen	klankbordgroep
63	KB4	1 dag?	maa 24/01/28	maa 24/01/28	56BE+15 dagen	klankbordgroep
64	KB5	1 dag?	maa 27/10/25	maa 27/10/25		klankbordgroep
65	KB6	1 dag?	maa 10/07/28	maa 10/07/28	57BE+15 dagen	klankbordgroep
66		1 dag?	maa 2/03/26	maa 2/03/26		

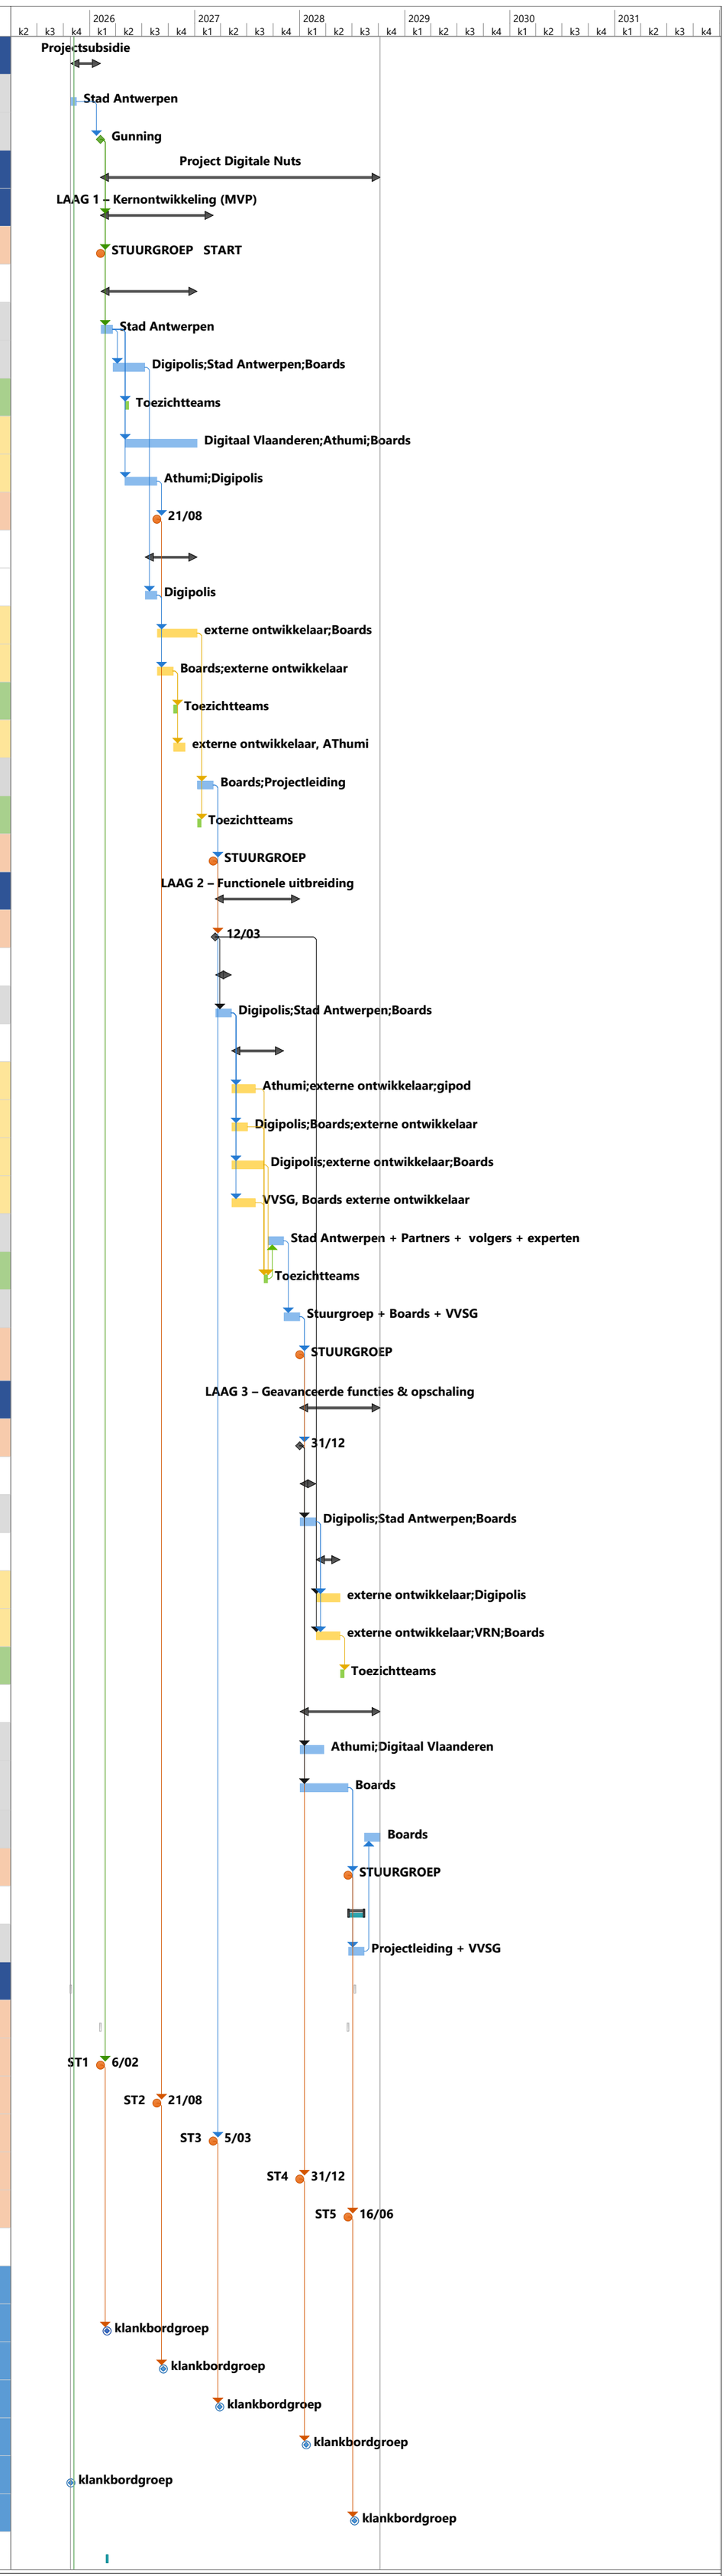

Project: PLANNING BIJ INDIENI
Datum: vri 7/11/25

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline | Voortgang | Voortgang, handmatig
